


TABLEAU DE BORD DU PROJET : Etat d'avancement au : Auteur :

« CCHP Envir.challenges »
30/09/2014
Communauté de Haute Provence




Dépenses réalisées par action au 30/09/2014

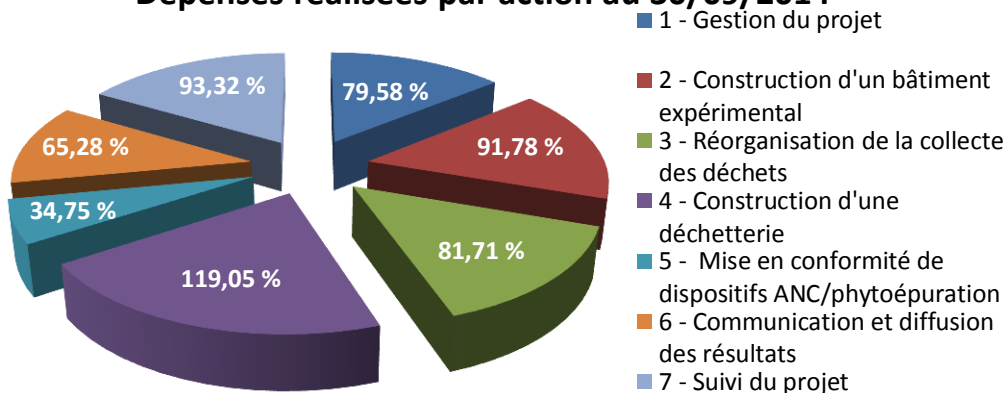

Actions	%	Coût dépensé au 31/09/2014	Coût final projeté
1 - Gestion du projet	78,84	171 086,69 €	217 000,00 €
2 - Construction d'un bâtiment expérimental	91,78	222 568,10 €	242 500,00 €
3 - Réorganisation de la collecte des déchets	81,71	626 133,70 €	766 250,00 €
4 - Construction d'une déchetterie	167,15	1 221 229,23 €	730 600,00 €
5 - Mise en conformité de dispositifs ANC/phytoépuration	34,75	34 748,64 €	100 000,00 €
6 - Communication et diffusion des résultats	65,28	49 680,43 €	76 100,00 €
7 - Suivi du projet	88,28	30 590,00 €	34 650,00 €
TOTAL	108,72	2 356 036,79 €	2 167 100,00 €

Avancement du projet

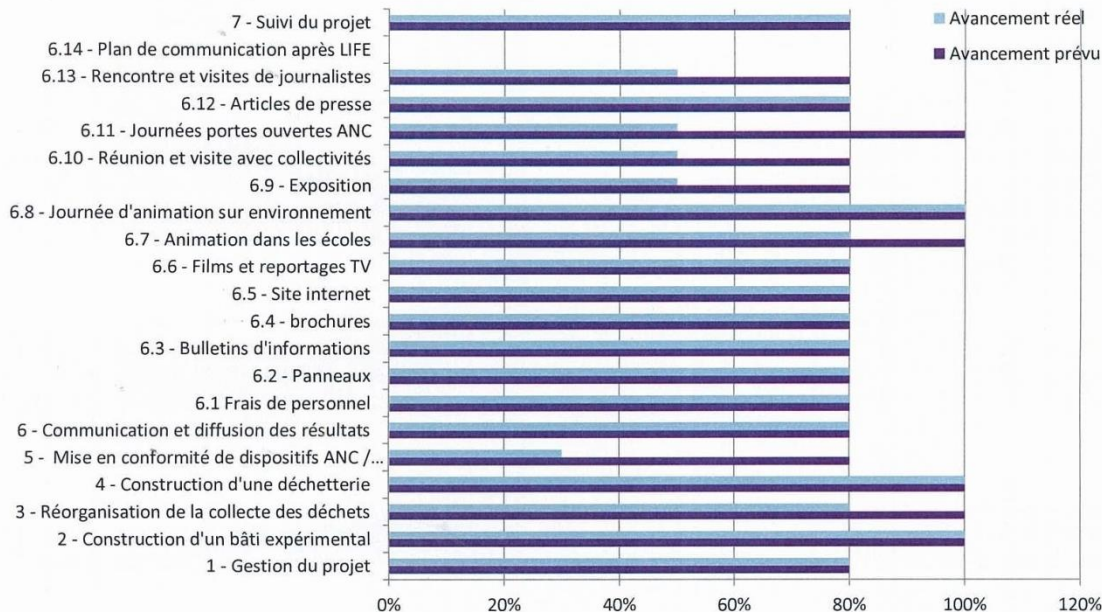

Au niveau du **budget**, nous avons dépensé **115 % du coût prévu** et **109 % du coût final projeté**.

Ce dépassement s'explique par les dépenses liées à la déchetterie qui ont été sous-estimées dans le projet initial ainsi que le changement de terrain qui a occasionné des dépenses supplémentaires.

Des **dépenses** ont été réalisées dans **toutes les actions**. Toutes les actions sont en voie d'être achevées sauf l'action 5 qui rencontre des difficultés pour trouver l'adhésion des particuliers.

L'**avenant n°2** a été accepté par la Commission Européenne et permet ainsi de prolonger le projet d'une année, soit jusqu'au 31/12/2015, pour pouvoir atteindre les objectifs. Des modifications budgétaires ont également été actées dans cet avenant.
