


TABLEAU DE BORD DU PROJET : Etat d'avancement au : Auteur :

« CCHP Envir.challenges »
30/09/2013
Communauté de Haute Provence



Dépenses réalisées par action au 30/09/2013

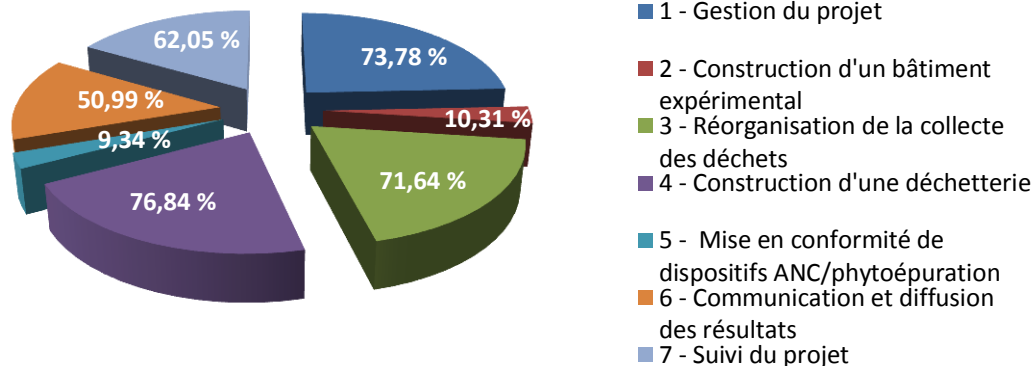

Actions	Coût dépensé au 31/09/2013	Coût final projeté	%
1 - Gestion du projet	147 129,24 €	162 000,00 €	90,82%
2 - Construction d'un bâtiment expérimental	39 160,14 €	380 000,00 €	10,31%
3 - Réorganisation de la collecte des déchets	577 631,21 €	806 250,00 €	71,64%
4 - Construction d'une déchetterie	808 734,94 €	1 025 850,00 €	78,84%
5 - Mise en conformité de dispositifs ANC/phytoépuration	15 873,80 €	170 000,00 €	9,34%
6 - Communication et diffusion des résultats	38 802,48 €	76 100,00 €	50,99%
7 - Suivi du projet	20 340,00 €	32 780,00 €	62,05%
TOTAL	1 647 671,81 €	2 652 980,00 €	62,11%

Au niveau du **budget**, nous avons dépensé **73% du coût prévu** et **62% du coût final projeté** qui, finalement sera plus important.

Des **dépenses** ont été réalisées dans **toutes les actions**. Toutes les actions sont en voie d'être achevées sauf l'action 5 qui rencontre des difficultés pour trouver l'adhésion des particuliers et qui fera l'objet d'une demande de révision.

Même si la plupart des actions sont bien avancées, **il ne restera qu'une année pour parvenir aux objectifs fixés initialement** ce qui semble difficile sur ce type de projet qui nécessite un changement de mentalités. Une demande de prolongation de 12 mois sera donc sollicitée en même temps que la révision.

